WEISS INGENIEURE GMBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
BÖTZINGER STRASSE 29 79111 FREIBURG
TEL: 0761/45283-50 FAX: 0761/45283-99

AUFTRAG NR.:	ANLAGE:
10023.0	5
ZEICHEN:	SEITE:
Si/Sd	1

DATUM: 31.05.2010

Grundwasserbeobachtungspegel in Rammkernsondierungen und Schürfgruben

Bauvorhaben: Hochwasserbecken im Hexental – Standort Stöckenhöfe

Pegel Nr.: P1

Pegelausbau am: 31.05.2010

Wetter beim Ausbau: trocken

Höhenlage des Bezugspunkts: _____mNN	Höhe OK Pegel: 354,11 mNN	Höhe OK Gelände: 353,13 mNN

Bezeichnung und Lage des Höhenbezugspunkts: _____

Wasserprobe entnommen:

ja ☒ Tiefe: _____m

nein ☐

Rammkern-sondierung Endtiefe: _____m

Rammkernsondierung als Pegel ausgebaut ☒

Schürfgrube als Pegel ausgebaut ☐

Pegelausbau

ja ☐ nein ☒

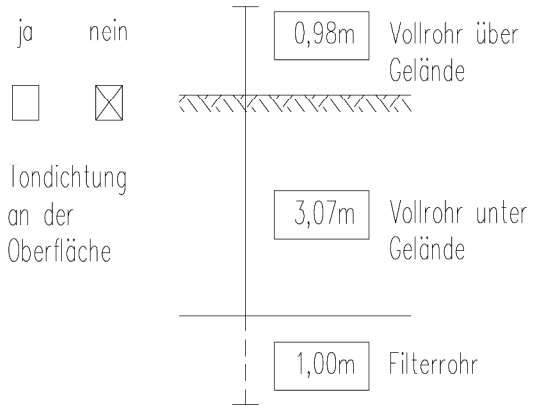

Bemerkungen: _____

Datum:	Uhrzeit:	Wasserstand unter OK Pegel [m]	Wasserstand [mNN]	Bemerkungen:
31.05.2010	14:35	4,50	349,61	
17.06.2010	12:15	4,64	349,47	

WEISS INGENIEURE GMBH
BERATENDE INGENIEURE VBI
BÖTZINGER STRASSE 29 79111 FREIBURG
TEL: 0761/45283-50 FAX: 0761/45283-99

AUFTRAG NR.:	ANLAGE:
10023.0	5
ZEICHEN:	SEITE:
Si/Sd	2

DATUM: 31.05.2010

Grundwasserbeobachtungspegel in Rammkernsondierungen und Schürfgruben

Bauvorhaben: Hochwasserbecken im Hexental - Standort Enge II

Pegel Nr.: P2

Pegelausbau am: 31.05.2010

Wetter beim Ausbau: trocken

Höhenlage des Bezugspunkts: _____mNN	Höhe OK Pegel: 339,10 mNN	Höhe OK Gelände: 338,77 mNN

Bezeichnung und Lage des Höhenbezugspunkts: _____

Wasserprobe entnommen:

ja ☐ Tiefe: _____m

nein ☐

Rammkern-sondierung Endtiefe: _____m

Rammkernsondierung als Pegel ausgebaut ☐

Schürfgrube als Pegel ausgebaut ☐

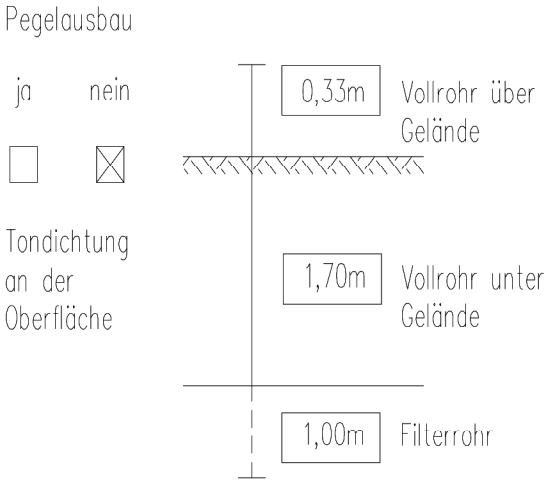

Bemerkungen: _____

Datum:	Uhrzeit:	Wasserstand unter OK Pegel [m]	Wasserstand [mNN]	Bemerkungen:
31.05.2010	14:51	2,79	336,31	
17.06.2010	12:25	1,61	337,49	
